

CONSEIL REGIONAL
17 et 18 décembre 2020
DELIBERATION

Agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) du patrimoine régional lycées
- Bilan à mi-parcours

Le Conseil régional convoqué par son Président le 24 novembre 2020, s'est réuni le vendredi 18 décembre 2020 au siège de la Région Bretagne, sous la présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional.

Etaients présents : Monsieur Olivier ALLAIN (à partir de 13h30), Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT (en visioconférence), Monsieur Eric BERROCHE (en visioconférence le matin), Madame Catherine BLEIN (en visioconférence), Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (en visioconférence le matin), Monsieur Gwenegan BUI (en visioconférence), Monsieur Thierry BURLLOT, Madame Gaby CADIOU, Madame Fanny CHAPPE, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANÉA (jusqu'à 16h50), Monsieur André CROCQ, Madame Delphine DAVID (en visioconférence), Monsieur Gérard DE MELLON (en visioconférence), Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Laurence DUFFAUD, Monsieur Richard FERRAND (en visioconférence), Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (en visioconférence), Monsieur Hervé GUELOU (en visioconférence le matin), Madame Claire GUINEMER (en visioconférence), Monsieur Philippe HERCOUËT, Madame Kaourintine HULAUD (en visioconférence), Monsieur Bertrand IRAGNE (en visioconférence), Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO (en visioconférence), Monsieur Roland JOURDAIN (en visioconférence), Madame Katja KRÜGER (en visioconférence), Monsieur Gérard LAHELLEC, Madame Isabelle LE BAL, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER, Monsieur Olivier LE BRAS (en visioconférence), Monsieur Raymond LE BRAZIDEC (en visioconférence le matin), Madame Agnès LE BRUN, Monsieur Patrick LE DIFFON, Monsieur Marc LE FUR (jusqu'à 18h20), Monsieur Patrick LE FUR (en visioconférence le matin), Madame Gaël LE MEUR (en visioconférence), Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC (en visioconférence), Madame Gaël LE SAOUT (en visioconférence), Madame Christine LE STRAT (en visioconférence), Monsieur Christian LECHEVALIER (en visioconférence le matin), Madame Lena LOUARN, Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Philippe MIALHES, Monsieur Paul MOLAC (en visioconférence le matin), Madame Gaëlle NICOLAS (en visioconférence), Madame Gaëlle NIQUE (en visioconférence le matin), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN (en visioconférence le matin), Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD (en visioconférence), Monsieur Bertrand PLOUVIER (en visioconférence), Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD (en visioconférence), Madame Emmanuelle RASSENEUR (en visioconférence), Madame Agnès RICHARD (en visioconférence), Monsieur David ROBO (en visioconférence), Madame Claudia ROUAUX, Monsieur Stéphane ROUDAUT (en visioconférence), Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (en visioconférence), Madame Renée THOMAÏDIS, Madame Martine TISON (en visioconférence), Madame Anne TROALEN (en visioconférence), Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI (en visioconférence).

Avaient donné pouvoir : Monsieur Olivier ALLAIN (pouvoir donné à 13h30), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MALEDRIAN (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH), Monsieur Pierre KARLESKIND (pouvoir donné à Monsieur Marc COATANEA jusqu'à 16h50 puis à Monsieur Raymond LE BRAZIDEC).

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 4111-1 et suivants ;

Vu la Délibération n°15_DIL_DIL_01 du 16 octobre 2015 ;

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil Economique Social et Environnemental lors de sa réunion du 7 décembre 2020 ;

Vu l'avis de la commission Education, formation et emploi en date du 9 décembre 2020 ;

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;

Et après avoir délibéré ;

- **A PRIS ACTE** de ce bilan à mi-parcours de la mise en accessibilité du patrimoine ERP Régional.

Le Président,



Loïc CHESNAIS-GIRARD



Direction de l'Immobilier et de la Logistique

Décembre 2020
Commission Éducation, formation et emploi

Agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) du patrimoine régional lycées - Bilan à mi-parcours

- Le contexte réglementaire de l'Ad'AP

Accueillir les lycéens, tous les lycéens, c'est rendre les locaux accessibles aux personnes en situation de handicap, lycéens comme professeurs et personnels, et ainsi permettre l'accès à la formation de son choix à l'échelle du bassin d'emploi de la politique éducative (BAPE).

La Région Bretagne dispose d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires. En effet, plus de 1 300 bâtiments (dont 942 établissements recevant du public) répartis sur plus de 120 sites, soit 2 millions de mètres carrés, constituent le patrimoine régional.

Dans le cadre de la mise en accessibilité de son patrimoine bâti, et sur la base des diagnostics de 2009 et 2011, la région Bretagne avait voté en Octobre 2015, un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) de ces établissements recevant du public (ERP), majoritairement constitués par les lycées publics Bretons (109 lycées et 8 sites ERP hors lycées). Le délai réglementaire pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité est de 9 ans (3 périodes de 3 ans) soit le 29/04/2025 pour le patrimoine régional.

Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, l'article D.111-19-45 du code de la construction et de l'habitation impose au propriétaire le suivi de la mise en œuvre de l'Ad'AP et une information de mise à jour auprès des autorités. Les délais à respecter pour le point de suivi de l'Ad'AP de la Région sont déclinés dans le tableau suivant :

A compter de l'accord préfectoral (29/04/2016)	Éléments de suivi à remettre en préfecture	Ad'AP Patrimonial Soit 6 ou 9 ans
1 An	Point de situation	29/04/2017
A la moitié de la durée de l'Ad'AP	Bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité	29/10/2020
En fin d'Ad'AP	Attestation d'achèvement	29/04/2025

- Le bilan à mi-parcours

Le bilan à la moitié de la durée de l'agenda (« bilan mi-Ad'AP ») est un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés. Comme le prévoit l'arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée, ce bilan doit contenir :

- « Les éléments d'identification du maître d'ouvrage ;
- Le numéro de référence de l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que sa date d'approbation ;
- L'identification du patrimoine concerné (inscrit à l'Ad'AP + évolutions) ;
- L'estimation financière initiale figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée ;
- Les éléments chiffrés relatifs à l'état d'avancement de l'agenda d'accessibilité programmée :

- le nombre total d'ERP et d'installations ouvertes au public (IOP) figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée ;
 - le nombre d'ERP et IOP dont les travaux de mise en accessibilité sont en cours ou achevés.
- La justification des écarts significatifs par rapport à l'estimation financière initiale ;
 - Le nombre et le type des dérogations accordées par établissement recevant du public ou installation ouverte au public ;
 - Les travaux ou actions réalisés ;
 - Le cas échéant, l'état d'avancement du dispositif de formation aux besoins des personnes handicapées des personnels en contact avec le public ;
 - Les modalités de la politique d'accessibilité conduite sur le territoire et de la concertation engagée avec les commerçants et les associations de personnes handicapées ;
 - Tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l'autorité ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée, notamment les solutions d'effet équivalent proposées et approuvées. »

Le bilan à mi-parcours doit, outre apporter les informations de l'évolution du cadre bâti (actions et travaux réalisés, en cours, ou non démarrés), expliciter les méthodes de concertation avec les usagers pour répondre rapidement à leurs demandes, dans l'attente des obligations de moyens faites au propriétaire, et évaluer les résultats des solutions équivalentes mises en œuvre (techniques, organisationnelles...).

Pour une collectivité territoriale elle doit préciser, en sus, les actions de concertation qu'elle a conduites ou envisage de conduire avec les associations d'usagers. Ces actions de concertation, nécessitant réactivité et agilité, impose la mise en place d'une méthode.

Le bilan à mi-parcours de l'Ad'AP est établi sur un document imposé de type CERFA et est joint en annexe au présent rapport et accessible via le lien ci-dessous :

<https://transfert.region-bretagne.fr/q5tq>

- Le public concerné

D'après les données statistiques du rectorat, la population des élèves en situation de handicap en 2019 s'élevait à 1 255 élèves soit 1,7 % de l'effectif total dans les lycées publics soit + 0,4% par rapport à 2013. Les travaux prennent en compte l'ensemble des publics et usagers (personnels, enseignants) dont la région ne dispose pas du suivi statistique.

Le nombre de lycéens en situation de handicap tend à augmenter chaque année. Cette évolution est à mettre en rapport avec la demande des familles de choix d'orientation les plus ouverts possibles et d'une scolarité la plus intégrée possible. Les handicaps rencontrés sont les handicaps psychiques ou cognitifs dans 80% des situations.

1.1- Rappel de la situation de 2015

La mise en accessibilité du patrimoine s'entend pour tous les handicaps qu'ils soient physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques. L'ensemble du patrimoine régional a fait l'objet de diagnostics qui recensent toutes les non-conformités à l'accessibilité des sites.





Ces diagnostics ne constituent pas une obligation de résultat mais construisent, avec d'autres indicateurs liés à l'état du bâti et aux consommations énergétiques pour ne retenir que les principaux, une base de travail pour concevoir la mise en accessibilité de chaque site en fonction des caractéristiques techniques, des fonctions propres à chaque bâtiment et de leur devenir ainsi que du rapport entre la solution retenue et le gain d'accessibilité procuré.

Les ERP du patrimoine régional ont fait l'objet d'une première campagne de diagnostics entre 2009 et 2011. Sur la base de ces diagnostics, la situation présentée en 2015, lors du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée était la suivante :

- Le taux moyen d'accessibilité du patrimoine était de 72%, taux variant en fonction de la catégorie de handicap concerné.
- Au total 22 sites sur 109 présentaient des non-conformités majeures (c'est à dire des sites au taux moyen d'accessibilité inférieur à 65 %)
- Et au contraire seuls 16 sites avaient un taux moyen supérieur à 85 %.
- 2 sites ont un taux d'accessibilité moyen inférieur à 20%
- L'analyse globale des diagnostics montrait une hétérogénéité des situations assez représentative de l'état de l'ensemble du patrimoine avec une situation plus défavorable en termes de conformité réglementaire pour 20 % des sites

**Répartition du taux d'accessibilité moyen des ERP du patrimoine régional
2015 :**

Envoyé en préfecture le 23/12/2020
Reçu en préfecture le 23/12/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20201218-20_DIL__02-DE

			
Handicap moteur	Handicap visuel	Handicap auditif	Troubles cognitifs
80%	79%	56%	69%

Répartition du taux d'accessibilité moyen des ERP du patrimoine régional par département en 2015

Dép	Taux moyen accessibilité (%) Situation 2015
22	65%
29	72%
35	76%
56	73%
<i>Moyenne</i>	72%

Cet état des lieux a servi de base à la stratégie régionale de mise en accessibilité et à l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) déposé en décembre 2015.

1.2- L'investissement immobilier : comment notre SDI intègre l'accessibilité

Avec le dépôt de cet Ad'AP, la Région s'est engagée à respecter l'objectif réglementaire de 100% du patrimoine ERP accessible pour le 29 avril 2025.

Les opérations de mise en accessibilité sont donc intégrées au schéma directeur immobilier Régional.

Pour mémoire, le SDI a été décomposé en 8 axes, dont 3 ont été affichés comme prioritaires, dont l'axe 2 : « Assurer la mise en conformité des sites en matière d'accessibilité et de sécurité ».

Les 20 sites suivants sont identifiés axe 2 car ils présentent le plus de non-conformités et nécessitent une stratégie de mise aux normes systématique.

Liste des Lycées en Axe 2 du SDI

Dép	VILLE - LYCEE
22	PAIMPOL - LYCÉE KÉRAOUL
	ST BRIEUC - LYCÉE RABELAIS
29	BREST - LYCÉE LA PEROUSE - KÉRICHEN
	LANDERNEAU - LYCÉE DE L'ELORN
	QUIMPER - LYCÉE CHAPTAL
	QUIMPER - LYCÉE DE CORNOUAILLE
	QUIMPERLE - LP ROZ GLAS
	TREFFIAGAT - L.P.M. DU GUILVINEC
	CESSON SEVIGNE - LYCÉE SÉVIGNÉ
35	MONTFORT SUR MEU - LYCÉE CASSIN
	REDON - EREA REDON
	RENNES - LP COËTLOGON
	VITRE - LYCÉE BERTRAND D'ARGENTRÉ
	AURAY - LYCÉE BENJAMIN FRANKLIN
56	ETEL - LP EMILE JAMES
	LORIENT - LYCÉE DUPUY DE LÔME
	PLOEMEUR - E.R.E.A.
	PONTIVY - LYCÉE JOSEPH LOTH
	ST JEAN BREVELAY - LP AGRICOLE

Les opérations de mise en accessibilité sont de 3 types :

- Opérations globales de mise en accessibilité de l'intégralité des sites, intégrés aux plans d'actions du SDI (axes 1 et 2)
- Opérations de restructuration d'un bâtiment comprenant réglementairement un volet mise en accessibilité
- Opérations ponctuelles et spécifiques à l'accueil d'un élève en situation de handicap, qui ne sont pas intégrées aux plans d'actions mais sont traitées hors plan d'actions si nécessaire. Les travaux réalisés via ces opérations permettront d'anticiper les opérations de mise en accessibilité globale.

1.3- Une stratégie globale

La mise en accessibilité s'intègre dans une stratégie plus large qui passe par des actions de recensement, de suivi, d'animation, de communication, de concertation, de formation, de sensibilisation.

Afin d'agir sur tous ces leviers et au regard des objectifs attendus, la Région s'est donnée les moyens de cette stratégie par le recours à une ressource externe via un accord-cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage notifié en juillet 2018.

Cet expert a accompagné les services sur les missions suivantes :

- Création des registres publics d'accessibilité
- Création d'une plateforme dématérialisée d'archivage des registres (outil unifié et uniformisé, à disposition des chefs d'établissements, non dessais de leurs obligations, sous pilotage de la collectivité support)
- Mise à jour des diagnostics accessibilité de 2009 et 2011 (suite aux modifications de la réglementation en 2014 et 2017) et suite à l'évolution du patrimoine bâti depuis le dépôt de l'Ad'AP
- Exploitation des bases de données afin de permettre l'établissement de bilans de suivi de l'Ad'AP
- Formations des agents d'accueil des lycées à l'accueil de personnes en situation de handicap dire combien
- Rédaction de programmes de travaux dans le cadre de la mise en accessibilité globale d'un site ou dans le cadre de travaux ponctuels urgents en perspective de l'accueil d'un élève en situation de handicap

Le budget pour les prestations intellectuelles affecté via l'accord-cadre de cette expertise d'assistance à maîtrise d'ouvrage accessibilité est de 400 000€HT par an pour un montant global de 1 400 000€HT.

2.1- Actions menées depuis 2015

Depuis le dépôt de l'Ad'AP en 2015, les actions suivantes ont été menées pour améliorer l'accessibilité des ERP du patrimoine régional.

2.1.1 Des actions d'ingénierie

- Mise en place d'une étude de priorisation :

Le schéma directeur immobilier et l'Ad'AP ont nécessité une mise en cohérence et une déclinaison plus fine afin de les traduire en terme opérationnel (engagement d'une étude de programmation sur les bâtiments concernés, études ou travaux en cours) avec des échéances calendaires conformes aux engagements de l'Ad'AP.

Face à ce constat et sur la base des résultats des diagnostics mis à jour, une étude a été menée par l'AMO pour prioriser et planifier les travaux de mise en accessibilité d'ici le délai réglementaire.

Les critères de priorisation retenus sont, par ordre de priorité, les suivants :

- N°1 : Lycées Axes 1 et 2
- N°2 : Bât à rénover inscrits au PA 19-20
- N°3 : Rapport coût / gain en accessibilité intéressant
- N°4 : Cités scolaires
- N°5 : Lycées agricoles, lycées professionnels

Cette priorisation se concrétise par la mise en place d'un planning des opérations de l'ADAP présenté en annexe 4 au présent document.

- **Mise à jour du référentiel Région :**

Afin de s'assurer de la bonne prise en compte de la réglementation relative à la mise en accessibilité des ERP neufs et existants et des bonnes pratiques, le référentiel Accessibilité de la Région a été mis à jour par l'AMO. Il conviendra ensuite de le communiquer vers les chefs de projet et conducteurs de travaux Région, vers les encadrants des lycées, vers les mandataires, et vers les maîtres d'œuvre.

Le coût engagé pour la mise à jour du référentiel Accessibilité de la Région est de 9 900 € TTC.

- **Création d'un prototype de registre public d'accessibilité et d'un registre initial :**

Le Registre Public d'Accessibilité, document de référence centralisant toutes les actions mises en place pour faciliter l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux services délivrés dans le bâtiment) doit être mis à disposition du public (évolution réglementaire datant d'avril 2017). Le prototype du registre public d'accessibilité a été élaboré par l'AMO en collaboration avec les services régionaux et avec le rectorat. Il a été validé en juillet 2019. Ce registre se présente sous une forme pdf et sous une forme dématérialisée (plateforme en ligne : cf ci-après). 100% des registres ont été créés depuis 2015.

- **Création d'un registre public d'accessibilité initial et d'un portail d'archivage :**

Le prototype a servi de base à la création d'un registre initial par lycée et par bâti ERP non lycée sur la base des diagnostics de 2009 et 2011. Ces registres se présentent sous une forme pdf et sous une forme dématérialisée, centralisée sur une plateforme. Ils sont mis à disposition des établissements et la plate-forme est opérationnelle pour l'ensemble des établissements.



- **Mise à jour des diagnostics accessibilité :**

Les diagnostics accessibilité de 2009 et 2011 ont été mis à jour courant 2020 pour l'ensemble des lycées et des bâtis ERP hors lycées. Ils se présentent sous forme de fichiers tableurs (extraction de la base de données de l'AMO). 100% des diagnostics ont été mis à jour.

- **Mise à jour des registres public d'accessibilité et validation :**

Les diagnostics actualisés ont permis de mettre à jour les registres publics d'accessibilité. Ils ont été transmis aux établissements pour validation. A ce jour, 83 ERP sur les 118 les ont validés (validation de la version pdf et de la version dématérialisée).

Les coûts engagés pour la mise à jour des diagnostics et l'élaboration des registres publics d'accessibilité pour les 118 ERP sont de 101 544 € TTC.

- **Rédaction de programmes de travaux**

Les actions d'ingénierie se sont également traduites par la rédaction de programmes d'accessibilité globale d'un site ou dans le cadre de travaux ponctuels urgents en situation de handicap : 100% de l'objectif de programmes ponctuels atteint

- Actions de sensibilisation

Ces actions auprès des établissements concernent l'exploitation des bases de données afin de permettre l'établissement de bilans de suivi de l'Ad'AP et faciliter le suivi de la mise en accessibilité (démarches en cours), des formations des agents d'accueil des lycées à l'accueil de personnes en situation de handicap (100 agents formés, restent 17 agents à former dont 9 en lycées) et la mise en place de campagnes de sensibilisation dans les établissements.

2.1.2- Travaux de mise en accessibilité

Les travaux de mise en accessibilité menés depuis le dépôt de l'Ad'AP en 2015 sont donc de 3 types :

- **Les travaux de mise en accessibilité globale (à l'échelle d'un lycée) :**

Il s'agit de travaux permettant de rendre accessible l'intégralité des bâtiments du site et les extérieurs. Ils concernent les axes 1, 2 et les cités scolaires (incluant un collège) en axe 8. Depuis le dépôt de l'Ad'AP en 2015, la Région a engagé les crédits pour 4 opérations de mise en accessibilité globale :

Ville	Lycée	Axe Lycées	Engagé € TTC (programme)	Affecté € TTC (travaux)
LANDIVISIAU	LEON	2	3 060	230 000
BREST	HARTELOIRE	8	3 660	187 200
BREST	IROISE	8	3 960	136 800
QUIMPERLE	ROZ GLAS	2	3 360	215 000
Total			14 040 € TTC	769 000 € TTC

Certaines des opérations de mise en accessibilité globale prévues en 2021 ont déjà fait l'objet de programmes.

Ville	Lycée	Axe Lycées	Engagé € TTC (programme)
TREFFIAGAT	LPM GUILVINEC	2	3 060
QUIMPER	CHAPTAL	2	3 960
LANDERNEAU	ELORN	2	3 480
PAIMPOL	KERRAOUL	2	3 360
QUIMPER	CORNOUAILLE	2	3 660
CESSON	SEVIGNE	1	3 030
QUIMPER	THEPOT	2	3 360
TINTENIAC	BEL AIR	8	3 030
CHATEAULIN	AULNE	1	2 730
RENNES	ZOLA	8	4 290
LORIENT	LE FRANC	5	3 030
Total			36 990 € TTC

Dans l'attente des autres opérations de mise en accessibilité globale, qui courent jusqu'en 2025, il est possible de réaliser les travaux ponctuels et spécifiques (cf ci-dessous).

Les coûts engagés pour la rédaction des programmes des opérations globales sont de 36 990 € TTC. Les coûts engagés pour les travaux dans le cadre d'opérations globales de lycées sont de 769 000 € TTC.

- **Les travaux de mise en accessibilité localisée sur un bâtiment :**

Il s'agit de travaux de rénovation d'ampleur de certains bâtiments d'un site. Depuis 2015, des bâtiments ont été entièrement rénovés ou démolis pour être reconstruits. La mise en accessibilité fait partie intégrante de ces opérations. Les bâtiments ayant fait l'objet de travaux comprenant un volet accessibilité depuis 2015 sont listés à l'annexe 2.

Les coûts travaux globaux engagés depuis 2015 sur ces opérations sont de 251 M€ ; on estime que la mise en accessibilité représente environ 6% du montant global. 15M€ ont été consacrés à la mise en accessibilité dans le cadre de ces travaux sur un bâtiment.

- **Les travaux ponctuels et urgents :**

Il s'agit de travaux permettant de rendre accessibles le périmètre et les services fréquentés par l'élève en situation de handicap. Ces travaux sont réalisés en urgence sans attendre les travaux de mise en accessibilité sur l'intégralité du site. Ce sont des opérations non inscrites au plan d'actions contribuant à répondre aux exigences réglementaires et aux demandes de certains lycées. Elles sont traitées soit en maîtrise d'œuvre directe soit par les mandataires. Dans la majorité des cas et des handicaps, ces travaux, anticipés, ne seront pas à reprendre dans le cadre de l'opération globale. Dans le cas de la malvoyance, des spécificités seront probablement à apporter notamment à la signalétique (contrastes visuels adaptés à la malvoyance de l'élève, les couleurs les mieux perçues variant d'une personne malvoyante à l'autre).

Depuis le dépôt de l'Ad'aP en 2015, la Région a engagé les crédits pour les opérations spécifiques suivantes :

Ville	Lycée	Engagé € TTC (programme)	Affecté € TTC (travaux)
QUINTIN	JEAN MONNET	1 890	100 000
ST QUAY	LA CLOSERIE	930	Prévu 2021
CHATEAULIN	JEAN MOULIN	660	Non réalisés à ce jour
RENNES	DESCARTES	1 110	Non réalisés à ce jour
MORLAIX	TRISTAN CORBIERE	1 290	Non réalisés à ce jour
ST BRIEUC	FREYSSINET	1 890	Non réalisés à ce jour
RENNES	LOUIS GUILLOUX	1 950	Prévu 2021
QUESTEMBERT	MARCELIN BERTHELOT	3 360	90 000
TREGUIER	JOSEPH SAVINA	2 730	Non réalisés à ce jour
ST BRIEUC	RABELAIS	1 770	Non réalisés à ce jour
LANNION	FELIX LE DANTEC	1 950	Non réalisés à ce jour
REDON	GRETA	1 110	Non réalisés à ce jour
ST BRIEUC	CHAPTAL	4 410	145 000
BREST	LA PEROUSE KERICHEN	3 540	Non réalisés à ce jour
ST MALO	MAUPERTUIS	2 700	Prévu 2021
Total		31 290 € TTC	335 000 € TTC

Les coûts engagés pour les travaux spécifiques et urgents de mise en accessibilité sont de 335 000 € TTC depuis 2015.

2.2- Evolution du niveau d'accessibilité depuis 2015

En 2015, les indicateurs utilisés étaient les suivants :

- Le taux d'accessibilité d'un bâtiment : c'est la moyenne des pourcentages de prescriptions réglementaires respectées de chaque niveau d'un bâtiment tout handicap confondu
- Le taux d'accessibilité du lycée : c'est la moyenne des taux d'accessibilité de chaque bâtiment et des extérieurs
- Le taux par département : c'est la moyenne des taux d'accessibilité des lycées d'un département.

Ces taux ont servi d'indicateurs de base au moment de la rédaction de l'Ad'AP en 2015. Les diagnostics ayant conduit à ces taux avaient été menés par des prestataires différents, occasionnant un manque d'homogénéité. Par ailleurs, la réglementation ayant évolué depuis 2015, avec des exigences renforcées conduisant à une dégradation des taux d'accessibilité, il a été nécessaire de reposer les indicateurs.

Nous avons opté pour un code couleur, pour tenir compte en plus de la notion de praticabilité. Les diagnostics ont ainsi été mis à jour avec ce nouvel indicateur et par un seul prestataire afin d'avoir une homogénéité de jugement sur les non-conformités.

Toutefois, afin d'évaluer l'évolution du niveau d'accessibilité des bâtiments des lycées depuis 2015, nous avons traduit les codes couleurs en taux d'accessibilité :

- **Rouge :** non accessible, non praticable de 0 à 65%
- **Orange :** non accessible mais praticable de 65 à 85%
- **Vert :** accessible taux supérieur à 85%

2.2.1 Niveau d'accessibilité par lycée

Depuis la première campagne de diagnostics, effectués entre 2009 et 2011, de nombreux travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation concernant l'accessibilité des sites. Le taux moyen d'accessibilité a donc évolué depuis 2015.






Evolution du taux d'accessibilité moyen des ERP du patrimoine régional entre 2015 et 2019

Dép	Taux moyen accessibilité (%)		Evolution
	2015	2019	
22	65%	68%	+3%
29	72%	78%	+3%
35	76%	76%	/
56	73%	75%	+2%
	72%	74%	+2%

Le taux d'accessibilité moyen des lycées s'est amélioré de +2% depuis 2015 ; réalités au regard des évolutions des définitions des taux rappelées en introduction.


Les différences par rapport aux pourcentages indiqués pour 2015 (page 8) s'expliquent par l'évolution de la réglementation et de celle de l'indicateur de suivi rappelé ci-après.

Ainsi, le taux moyen d'accessibilité par déficience est le suivant pour 2020 :

				
Handicap moteur	Mobilité réduite	Handicap visuel	Handicap auditif	Troubles cognitifs
62%	80%	57%	79%	92%

En 2019 :

- 8 sites ont un taux d'accessibilité supérieure ou égale à 85% contre 16 en 2015
- 51 sites ont un taux d'accessibilité compris entre 65% et 84%
- 59 sites ont un taux d'accessibilité compris entre 20% et 64% contre 22 en 2015
- Aucun site n'a un taux d'accessibilité moyen inférieur à 20% contre 2 en 2015

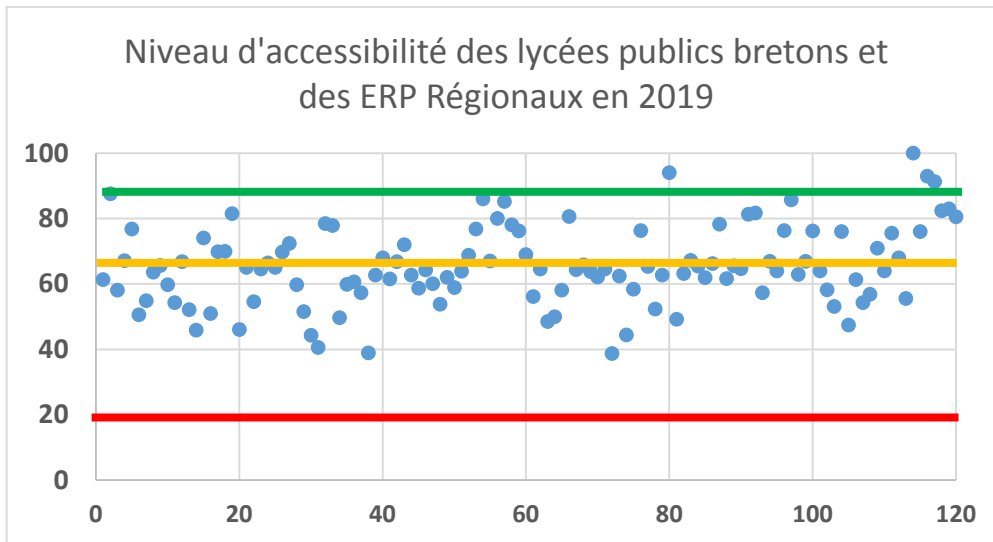

2.2.2 Niveau d'accessibilité par bâtiment de lycées

En 2015, 40 bâtiments étaient accessibles à 100%. Aujourd'hui, 172 bâtiments sont accessibles à 100% soit 132 bâtiments de plus qu'en 2015, dont 28 bâtiments de lycées en Axe 2. Ceci traduit l'avancée de la Région dans la mise en accessibilité de son patrimoine sur ces 5 dernières années. Les bâtiments totalement accessibles à ce jour sont listés à l'annexe 3.

3. Conclusions et perspectives

A mi-parcours de l'ADAP, les études menées et l'ingénierie déployée sur le sujet ont permis de mieux planifier et optimiser les actions à venir tout en confirmant l'objectif d'un patrimoine accessibilité à la fin de l'agenda 2025 comme cela est prévu dans l'Ad'AP. L'enjeu pour respecter la date, outre les difficultés liées aux volumes de travaux à entreprendre, reste bien un coût financier important qui devra être affecté avant le 29 avril 2025.

Par ailleurs, la gestion des données, leur suivi, la remontée (et l'absence de numérisation) des documents attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité par rapport à la réglementation relative à l'accessibilité restent un paramètre important pour le rendu compte de cette mise en œuvre.

Néanmoins, cette planification globale des travaux de mise en accessibilité a pu pluriannuel d'intervention et le schéma directeur immobilier. Le détail figure à

Lissage après priorisation	Coût total TTC	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22	16 493 341 €	0 €	752 979 €	4 712 691 €	3 893 003 €	2 253 827 €	4 718 551 €
29	25 362 042 €	1 326 607 €	3 940 824 €	5 651 448 €	4 780 136 €	4 804 983 €	4 858 043 €
35	19 013 048 €	620 395 €	746 013 €	5 054 096 €	6 148 858 €	1 848 373 €	4 595 314 €
56	13 716 997 €	0 €	164 919 €	2 055 934 €	2 182 642 €	3 629 503 €	5 683 999 €
Total	74 585 427 €	1 947 002 €	5 604 735 €	17 474 169 €	17 004 638 €	12 536 686 €	19 855 907 €

Le coût total des travaux de mise en accessibilité restant à engager s'élève à 75 M€ TTC.

Je vous propose :

- **DE PRENDRE ACTE de ce bilan à mi-parcours de la mise en accessibilité du patrimoine ERP Régional**

Le Président



Loïg CHESNAIS-GIRARD

Annexes :

Annexe 1 : Bilan mi Ad'AP :

<https://transfert.region-bretagne.fr/q5tq>

Annexe 2 : Travaux de restructuration de l'ensemble d'un bâtiment incluant le volet accessibilité depuis 2015

Ville	Etablissement	N° OP	Libellé	Date de réception proposée par le MOE	Axe Lycée	Coût OP (€ TTC)
CAULNES	LPA	OP190C38	Locaux agents - Achats de bâtiments modulaires	01/09/2019	1	530 310
GUINGAMP	Auguste Pavie	OP065012	Vie scolaire (restructuration)	09/06/2015	8	2 018 739
GUINGAMP	Jules Verne	OP105002	Locaux d'enseignement	17/09/2017	8	998 000
LAMBALLE	Henri Avril	OP 145032	Parking des professeurs	01/03/2016	1	189 980
LAMBALLE	Henri Avril	OP17DR7X	Déplacement et transformation bât modulaires	13/09/2017	1	576 778
LANNION	Félix le Dantec	OP115069	Trx réaménagement partiel du 3ème étage bât B	12/01/2016	8	473 569
LANNION	Félix le Dantec	OP130059	Travaux préparatoires à l'installation de bât modulaires	05/12/2016	8	52 112
LANNION	Félix le Dantec	OP1630UN	Transfert et transformation en vestiaires et douches de deux bâtiments modulaires	05/12/2016	8	178 908
LOUDEAC	Fulgence Bienvenue	OP115070	Internat (rénovation de l'internat)	28/11/2016	8	7 110 222
MERDRIGNAC	Mené	OP16RAME	Travaux de reprise de carrelage suite sinistres	14/12/2017	8	61 977
MERDRIGNAC	Mené	OP17DR7X	Installation bât modulaires	29/08/2018	8	583 097
PAIMPOL	Kerraoul	OP18RYNA	Locaux agents Achats de bâtiments modulaires	17/07/2019	2	166 000
PLOUISY	Kernilien	OP075059	Espaces sportifs intégrés (centre équestre)	11/07/2016	8	2 953 476
QUINTIN	Jean Monnet	OP17WUYH	Construction d'une halle technique travaux	20/01/2020	8	2 675 000
ROSTRENE	Rosa Parks	OP17VJ2G	Travaux internat (réfection des sanitaires et travaux divers)	26/04/2019	7	1 472 486
ROSTRENE	Rosa Parks	OP183VTE	Locaux agents achats de bâtiments modulaires	19/07/2019	7	248 000
ST BRIEUC	Chaptal	OP065121	Restructuration de l'administration	26/06/2015	1	2 536 706
ST BRIEUC	Ernest Renan	OP130001	Locaux d'enseignement (accueil de la section BTS tourisme)	05/01/2015	8	91 256
ST BRIEUC	Ernest Renan	OP16LOEC	Démolition partielle externat et construction d'un escalier de secours	05/03/2018	8	435 000
ST BRIEUC	Eugène Freyssinet	OP130059	Achat et restauration des bâtiments démontables	31/03/2015	1	90 392
ST BRIEUC	Rabelais	OP152K8A	Mise en conformité électriques et PMR	15/12/2018	2	200 000
ST QUAY PORTRIEUX	La Closerie	OP155007	Installations générales, agencement et aménagements des constructions	19/12/2016	8	42 537
TREGUIER	Savina	16000153	Travaux d'embellissement (peinture et revêtements de sols)	18/10/2016	8	70 904
TREGUIER	Joseph Savina	OP115086	Ateliers (restructuration)	12/02/2016	8	4 508 610
BREST	Dupuy de lôme	OP17KS82	Espaces agents (restru lingerie et espaces vie élèves trav	30/09/2019	5	1 121 000
BREST	Iroise	OP105064	Espaces élèves (rénovation vie scolaire du collège)	23/07/2015	8	1 144 912
BREST	La Pérouse	OP17HHM6	Reprise des désordres bat A	18/11/2019	2	253 000
BREST	Lesven	OP125020	Espace élèves	31/01/2017	1	1 042 097
BREST	Lesven et Vauban	OP115043	Accessibilité PMR	30/06/2015	1	1 527 534
BREST	Amiral Ronarc'h	17000608	Installation et Location bâtiments modulaire	28/08/2017	1	132 011
BREST	Amiral Ronarc'h	OP085097	Service de restauration	22/09/2017	1	4 456 563
BREST	Harteloire	OP051302	Service restauration - traitement acoustique et climatisation	21/04/2017	8	3 515 757
BREST	Iroise	OP125036	VRD Espaces verts	02/12/2015	8	341 830
BREST	Iroise	OP105097	Traitement de l'accessibilité PMR	06/04/2016	8	856 241
BREST	Kérichen	OP105120	VRD Espaces verts (rénovation des réseaux)	28/07/2017	2	3 478 036
BREST	Vauban	OP105104	Locaux d'enseignement	10/12/2017	1	635 831

Ville	Etablissement	N° OP	Libellé	Date de proposition	Axe	Coût OP
CARHAIX	Paul Sérusier	OP075095	Restructuration de l'externat 1	20/07/2015	7	4 604 411
CARHAIX	Paul Sérusier	OP145045	Restructuration externat	30/08/2018	7	959 193
CHATEAULIN	FPA suscinio	OP1830UX	Blocs travaux aménagement extérieurs	20/11/2019	1	249 159
CHATEAULIN	jean Moulin	OP17NFVQ	Service de restauration	27/08/2018	8	130 000
CONCARNEAU	Pierre Guéguin	OP125061	Restructuration de l'atelier	15/12/2016	8	282 441
CONCARNEAU	Pierre Guéguin	OP17H2YN	Transfert de la formation de charpentiers marine	02/09/2018	8	1 021 749
CONCARNEAU	Pierre Gueguin	OP051272	Locaux d'enseignement (rénovation espaces scientifiques et vie scolaire)	07/04/2015	8	2 791 817
CONCARNEAU	Pierre Gueguin	OP105013	Atelier de maintenance nautique	12/09/2016	8	2 574 162
LANDERNEAU	Elorn	OP155001	Espaces agents	29/08/2017	2	320 500
MORLAIX	Tristan Corbière	OP 075071	Restructuration générale	20/07/2016	1	14 889 930
MORLAIX	Tristan Corbière	OP075071	Restructuration bâtiments B et C	20/07/2016	1	11 301 696
MORLAIX	Tristan Corbière	OP1847XI	Espaces scientifiques	18/09/2017	1	180 000
MORLAIX	Tristan Corbière	OP18FM86	Locaux d'enseignement travaux complémentaires	05/06/2019	1	199 550
MORLAIX	Suscinio	OP105124	Locaux d'enseignement	16/03/2019	4	3 082 912
PONT DE BUIS	Lycée professionnel	OP105081	Ateliers	21/04/2019	8	756 453
PONT DE BUIS	Lycée professionnel	OP16831IR	Ateliers	15/02/2020	8	3 806 766
QUIMPER	Cornouaille	OP115020	VRD – Trx divers bâtiment internat	14/09/2015	2	105 780
QUIMPER	Brizeux	BC 16UTOB036	Réfection bloc sanitaire RDC	02/03/2017	8	20 917
QUIMPERLE	Kerneuzec	OP17ROVG	Réhabilitation du gardin de l'amphithéâtre	06/11/2017	8	142 700
TREFFIAGAT	LPM du Guilvinec	OP125071	Atelier soudure - Travaux de sécurité	10/02/2017	2	460 137
BAIN DE BRETAGNE	Brito	OP150KX4	Restructuration et extension	28/08/2018	6	11 670 801
BAIN DE BRETAGNE	Brito	OP125044	Restructuration extension	16/12/2015	6	3 586 081
BAIN DE BRETAGNE	Brito	OP 150KX4	Restructuration et extension PHASE 2	19/08/2016	6	11 870 801
COMBOURG	Chateaubriand	OP085051	Extension (service de restauration)	08/07/2016	8	5 324 071
COMBOURG	Chateaubriand	OP17DR7X	Installation bât modulaires	24/08/2018	8	168 834
DINARD	Lycée hôtelier	OP105088	Locaux enseignement (travaux sécurité et rénovation bat B2 externat)	31/12/2019	8	4 419 419
DOL	Alphonse Pelé	OP105092	Restructuration/CDI/Vie scolaire /Extension pour accueillir les locaux d'enseignement électronique TRAVAUX	25/03/2019	4	1 077 000
DOL DE BRETAGNE	Alphonse Pelé	17000608	Installation bât modulaires	19/04/2018	4	176 037
FOUGERES	Jean Guehenno	OP185NMS	Adaptation des locaux (formation BTS MCM, ATMFC) et préaux bât E	06/09/2018	6	537 536
LE RHEU	Théodore Monod	OP17339X	Service de restauration - Bâtiments modulaires	20/04/2018	6	1 120 445
LE RHEU	Théodore Monod	OP17K61R	Service de restauration - travaux	06/01/2020	6	5 754 000
LE RHEU	Théodore Monod	OP115074	Rénovation du gymnase	31/08/2015	6	1 717 518
LE RHEU	Théodore Monod	OP130018	Service de restauration (restructuration – études préalables)	06/01/2020	6	993 686
MONTFORT	René Cassin	OP125045	Extension et restructuration (service de restauration et locaux d'enseignement)	03/11/2019	2	1 151 616
REDON	Beaumont	OP155021	Espaces agents (restructuration laverie et pôle cuisson)	07/05/2019	1	1 497 000
RENNES	Chateaubriand	OP075065	Extension de l'internat	05/01/2015	8	8 399 361
RENNES	Joliot Curie	OP075099	Espace scientifique	01/05/2016	3	2 810 466
RENNES	Bréquigny	OP105027	Restructuration générale (construction service restauration)	21/01/2016	1	572 250
RENNES	Bréquigny	OP154777	Restructuration locaux	24/05/2017	1	1 061 941
RENNES	Bréquigny	OP17Vo2V	Locaux d'enseignement (aménagement BTS SN)	10/09/2018	1	236 656
RENNES	Bréquigny	OP17M745	Réhabilitation des espaces sportifs intégrés	15/11/2018	1	711 487
RENNES	Coëtlogon	OP15WX31	Restructuration du service laverie	10/11/2016	2	376 973
RENNES	Coëtlogon	OP051051	Administration (ext et restructuration) phase 3	22/05/2017	2	2 044 411
RENNES	Emile Zola	OP145035	Service de restauration – mise aux normes de la zone préparation froide et conformités	19/04/2016	8	135 704
RENNES	Jean Jaurès	OP170RLJ	Ateliers (adaptation des locaux pour la formation dma Horlogerie- Etudes	21/07/2020	8	87 434
RENNES	Jean Macé	OP130020	Restructuration (Locaux d'enseignement et espaces agents) Etudes	01/04/2020	3	495 142
RENNES	Joliot Curie	OP16KGHH	Création d'une aire sportive extérieure mutualisée	16/11/2017	3	1 052 000
RENNES	Joliot Curie	OP130030	Espaces sportifs intégrés (pistes d'athlétisme) EtudesDéconstruction et reconstruction des garages (liaison (Varende Mirabeau)	07/12/2017	3	95 000
RENNES	Joliot Curie	OP17GXAF	Déconstruction et reconstruction des garages (liaison (Varende Mirabeau)	10/12/2019	3	495 600
RENNES	Louis Guilloux	OP125040	Aménagement de la lingerie	27/02/2015	8	106 153
RENNES	Mendès	OP105025	Extension et restructuration	31/08/2017	3	9 950 364
RENNES	René Descartes	OP17DR7X	Achat bât modulaires	31/08/2017	8	173 789
RENNES	Victor et Hélène Basch	OP130056	Espace agents	29/02/2016	8	282 603

Ville	Etablissement	N° OP	Libellé	Date de proposition	Affiché le	Axe	Coût OP
					ID : 035-233500016-20201218-20_DIL_02-DE		
RENNES	Pierre Mendès	OP105025	Extension et restructuration de l'externat Etudes et travaux	17/11/2017		3	9 950 364
RENNES	Pierre Mendès	OP162DIR	restructuration de l'externat Travaux	12/12/2019		3	3 575 000
RENNES	Pierre Mendès	OP18NCZT	restructuration et extension Location bâtiment modulaire	20/01/2020		3	329 185
RENNES	Bréquigny	OP105057	Restructuration générale	25/07/2017		1	302 827
ST AUBIN DU CORMIER	Lycée agricole	OP105113	Restructuration du lycée phase 2	11/07/2016		8	8 533 991
ST AUBIN DU CORMIER	Lycée agricole	OP125064	Accessibilité du logement de fonction	30/11/2015		8	257 823
ST AUBIN DU CORMIER	Lycée agricole	OP105113	Restructuration du lycée phase 2	25/07/2016		8	7 730 641
AURAY	Duguesclin	OP16A61G	Mise en conformité des ateliers et clôtures	15/10/2018		1	335 500
AURAY	Benjamin Franklin	OP16UPDM	Achat bât modulaires	28/08/2017		2	527 274
ETEL	Emile James	OP18JXAJ	Salle à manger des commensaux et laverie-Achat bat modulaires	30/08/2019		2	206 400
ETEL	LPM	OP145042	Restructuration partielle des locaux d'enseignement	25/07/2017		1	590 500
GUER	Brocéliande	OP130032	Atelier (réfection toitures ateliers)	19/10/2016		3	1 828 051
GUER	Brocéliande	OP065079	Restauration générale PH 1 (construction internat, CDI, accueil et chaufferie bois)	20/04/2018		3	9 914 901
HENNEBONT	Victor Hugo	OP17DR7X	Installation bât modulaires	26/01/2018		8	167 844
JOSSELIN	Ampère	OP17Z895	Espaces agents (restructuration de la laverie)	30/08/2019		8	444 086
LANESTER	Jean Mace	OP145019	Espaces agents (restructuration de la laverie)	27/08/2015		5	208 282
LOCMINE	Louis Armand	OP065085	Restructuration générale	29/05/2016		8	5 324 904
LORIENT	Marie Le Franc	OP17DR7X	Installation bât modulaires	25/06/2018		5	238 577
PLOEMEUR	EREA	OP125007	Trx sécurité et d'aménagement divers	18/01/2016		2	733 641
PONTIVY	Joseph Loth	OP115064	Service de restauration	23/11/2016		2	3 837 749
QUESTEMBERT	Marcelin Berthelot	OP130065	Rénovation de la cuisine de l'établissement	27/08/2015		1	282 323
ST JEAN BREVELAY	Le Sullio	OP16NR1O	Etudes et Travaux Achat de vestiaires/sanitaires en bat modulaires	29/08/2019		2	666 675
VANNES	Charles de Gaulle	OP115065	Restauration ETUDES	30/06/2019		8	10 009 320
VANNES	Charles de Gaulle	OP16G508	Service de restauration – travaux	30/06/2019		8	5 142 000
VANNES	Lesage	OP105112	Accessibilité PMR	15/12/2015		1	1 200 817
VANNES	Lesage	OP105112	Bâtiment F et H	30/04/2018		1	963 554
VANNES	Lesage	OP115034	Restructuration infirmerie bât G, zone attente élèves restauration bât D	27/03/2018		1	2 878 104
VANNES	Lesage	OP18LF6D	Locaux CPGE Achats de vestiaires /sanitaires en modulaires	30/08/2019		1	400 000
Total							251 459 235 € TTC

Annexe 3 : Liste des bâtiments 100% accessibles en 2020

Ville	Lycée	Axe Lycée	Code bâtiment	Nom bâtiment
CAULNES	LP agricole	1	0221032CB14	I. Ateliers pédagogiques
			0221032CB20	Vestiaire élèves
DINAN	Lycée La Fontaine des Eaux	1	0220013VB15	01 externat, cdi & logt (6)
			0220013VB05	04 restauration-lingerie
GUINGAMP	LP Jules Verne	8	0220019BB02	B. Salle des profs
LAMBALLE	Lycée Henri Avril	1	0220196UB03	C. Externat
			0220196UB10	M. Foyer & atelier (n°2b)
			0220196UB22	Modulaires (6)
LANNION	Lycée Félix le Dantec	8	0220023FB08	A. Adminis & logt (2)
MERDRIGNAC	Lycée du Mené	8	0220023FB17	Vestiaires-préfa a & b
PAIMPOL	Lycée Kerraoul	2	0221031BB02	E. Serre n°2
PLOUISY	Lycée agricole Kernilien	8	0221571NB10	Préfabriqué (3 classes)
			0220470SB29	Centre équestre
QUINTIN	LP Jean Monnet	8	0220075MB04	E. Externat
			0220075MB13	G. Cabine de vernissage
			0220075MB15	Externat modulaire
ST BRIEUC	Lycée Rabelais	2	0220056SB09	B. Accueil & loge
			0220056SB11	C. Externat sciences
			0220056SB08	C1. Foyer
			0220056SB12	C2. Externat
			0220056SB04	C3. Gymnase
ST BRIEUC	Lycée Ernest Renan	8	0220057TB19	2 ensembles modulaires
ST BRIEUC	Lycée Eugène Freyssinet	1	0220060WB16	A1. Infirmerie
			0220060WB17	A2. Cuisine
			0220060WB18	C'. Externat
			0220060WB22	P1. Préfabriqué
TADEN	E.R.E.A.	1	0221569LB14	E. Atelier maçonnerie
TREGUIER	Lycée Joseph Savina	8	0220065BB06	A. Restauration & logt (2)
			0220065BB10	A1. Foyer
			0220065BB11	Ib. Externat
			0220065BB14	Ic. Cdi
			0220065BB17	M. Externat (préfa)
BREST	Lycée Amiral Ronarc'h	1	0290008BB09	Restauration
			0290008BB98	Externat (modulaire)
			0290008BB99	Sanitaire (modulaire)
BREST	Lycée Harteloire	8	0290010DB11	Modulaires sanitaires (2)
			0290010DB10	Modulaires sanitaires (2)
CARHAIX PLOUGUER	Lycée Paul Sérusier	7	0290022SB08	A. Externat n°1 & cdi
			0290022SB10	C3/c4. Ateliers pl
CHATEAULIN	Lycée Jean Moulin	8	0290023TB11	C1. Vie scolaire & préau
			0290023TB01	F. Inter-f, infi & logt (6)
			0290023TB05	G. Inter-g, exte, atelier op & logt
CHATEAULIN	Lycée agricole et horticole de l'Aulne	1	0290341NB14	A2. Restau & admini
			0290341NB16	A4. Gymna, foyer & amphi
			0290341NB17	A5. Cdi
			0290341NB12	Maçonnerie paysagère
			0290341NB22	F-externat - hanvec
			0290341NB23	G-externat - hanvec
CONCARNEAU	Lycée Pierre Guéguin	8	0290030AB05	o8. C.d.i
HANVEC	LEGTA HANVEC		0290341HB04	B4. Exter & logt (1)
			0290341HB23	G. Externat
LANDERNEAU	Lycée de l'Elorn	2	0290044RB19	Modulaires (3)
MORLAIX	Lycée Tristan Corbière	1	0290051YB03	B. Externat sciences
			0290051YB13	C. Externat
			0290051YB04	F. Exter & logt (3)
MORLAIX	Lycée agricole sis au lieu dit Suscinio	4	0290126EB18	Local legumerie
			0290126EB19	Hangar
			0290126EB17	Locaux pédagogiques
PLEYBEN	LP des Métiers du Bâtiment	8	0290130JB15	Plateforme gros oeuvre
PONT DE BUIS LES QUI-MERCH	Lycée professionnel	8	0290092TB13	F. Atelier
			0290092TB18	G - atelier mv
PONT LABBE	Lycée Laënnec	8	0290062KB02	E. Internat
QUIMPER	Lycée Brizeux	8	0290069TB07	Greta (hs)
QUIMPER	Lycée Yves Thépot	1	0290071VB01	D. Admi & cuisine
			0290071VB13	L. Préfabriqués (2)
QUIMPER	E.R.E.A	8	0290347VB08	Préfabriqué n°1
			0290347VB13	Préfabriqué n°2
TREFFIAGAT	L.P.M. du Guilvinec	2	0291107WB07	A2. Atelier moteur
			0291107WB13	Atelier sauvetage
			0291107WB14	Externat 1 (préfa)
BAIN DE BRETAGNE	Lycée Jean Brito	6	0352318EB15	D-externat sciences

Ville	Lycée	Axe Lycée	Code bâtiment	Nom bâtiment
BRUZ	Lycée Anita Conti	8	0352686EB01	Cdi
			0352686EB07	Externat sciences
			0352686EB05	Hall
			0352686EB08	Aile nord:externat
CESSON SEVIGNE	Lycée Sévigné	2	0352304PB11	Aile sud:externat
			0352304PB12	Préfabriqué
COMBOURG	Lycée F.R. de Chateaubriand	8	0352533NB07	Restauration
			0352533NB08	Préfabriqués (2)
DINARD	Lycée hôtelier Yvon Bourges	8	0350005RB14	Préfabriqués en loc (2)
			0350005RB15	Préfabriqué
DOL DE BRETAGNE	LP Alphonse Pelle	4	0350009VB05	Externat (préfa)
			0350009VB13	To2. Admini & vie scolaire
LE RHEU	Lycée Théodore Monod	6	0350700WB05	To4. Restauration
			0350700WB11	To8a. Foyer
			0350700WB02	To5. Infirmerie
			0350700WB07	To9. Vestiaires (enterrés)
			0350700WB46	To8b. Amphitheatre
			0350700WB03	T12. Gymnase
			0350700WB12	T13. Atelier hydraulique
			0350700WB26	T11. Cfppa
			0350700WB09	Externat n°2
MONTFORT SUR MEU	Lycée René Cassin	2	0352235PB06	E'. Externat
REDON	Lycée Beaumont	1	0350022JB14	L1. Externat (collège)
RENNES	Lycée Emile Zola	8	0350024LB23	M. Pôle médical
			0350024LB22	N. Externat collège
			0350024LB24	P. Externat mutuel
			0350024LB12	Q. Externat sciences
			0350024LB25	R. Exter & logt (1)
			0350024LB14	S. Vie scolaire
			0350024LB19	T. Externat mutuel
			0350024LB15	Restauration
RENNES	Lycée Jean Macé	3	0350026NB09	A. Admini & logt (3)
RENNES	Lycée Bréquigny	1	0350028RB03	B'. Salle polyvalente
			0350028RB07	E. Exter & cdi & logt (14)
			0350028RB05	F. Atelier techno
			0350028RB11	R. Restauration
RENNES	Lycée Pierre Mendès-France	3	0350028RB06	Labo bts
			0350030TB24	Préfabriqués d (3)
RENNES	LP Louis Guilloux	8	0350030TB26	B1. Externat (labo)
			0350032VB08	B2. Admini & externat
			0350032VB07	C. Internat
RENNES	Lycée Chateaubriand	8	0350032VB11	F. Internat- f & mi
			0350710GB01	Préfabriqués (4)
RENNES	E.R.E.A.	4	0350710GB09	C3. Ateliers
RENNES	Lycée Charles Tillon	8	0350747XB03	Laennec:a2-atelier
			0351054FB13	Laennec:a3-atelier pédagogique
			0351054FB14	Laennec:a-ateliers
RENNES	LP Coëtlogon	2	0351878BB05	A. Administration
			0351878BB02	A'. Inte & infir (hs)
			0351878BB12	N. Externat
			0351878BB29	C. Amphithéâtre (hs) & chaufferie
			0351878BB30	C. Cdi
RENNES	Lycée Victor et Hélène Basch	8	0352009UB04	D. Inter-g,exter & logt (1)
ST AUBIN DU CORMIER	LP agricole	8	0350940GB08	B/c. Externat (2 préfa)
			0350940GB06	E. Externat (préfa)
			0350940GB23	Cc1-restauration & vestiaires
ST MALO	Lycée Jacques Cartier	8	0350048MB04	B5-e. Internat-f
			0350048MB12	L1. Externat (préfa)
			0350048MB23	O. Pôle sciences
ST MALO	L.P.M. Florence Arthaud	8	0351914RB01	Atelier conchylicole
TINTENIAC	LP Bel Air	8	0350050PB06	A. Internat
			0350050PB18	F. Infir & logt (2)
AURAY	Lycée Benjamin Franklin	2	0561534NB10	A3. Externat
			0561534NB01	B. Externat
			0561534NB07	C. Restauration
			0561534NB11	Externat (modulaire)
ETEL	LP Emile James	2	0560008EB04	F. Foyer
			0560008EB14	R. Gymnase men glas (hors site)
ETEL	LPM	1	0561486LB08	D1. Externat (île de groix)
			0561486LB13	J. Préfabriqué
HENNEBONT	Lycée Emile Zola	8	0560070XB07	H. Atelier des îles
			0560070XB18	K. Atelier sérigraphie
HENNEBONT	CFA LE TALHOUËT		0560274TB09	Cfa talhouët : a1. Admini _restau
			0560274TB23	Cfa talhouët : a3. Cdi & externat
HENNEBONT	Lycée Victor Hugo	8	0561607TB01	A. Salle polyvalente
LANESTER	Lycée Jean Macé	5	0561698SB04	F. Atelier plasturgie

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le

Nom bâtiment

ID : 035-233500016-20201218-20_DIL_02-DE

Ville	Lycée	Axe Lycée	Code bâtiment	
LOCMINE	Lycée Louis Armand	8	0561507JB01	
LORIENT	Lycée Dupuy de Lôme	2	0560025YB05	Externat 01 & logt (4)
			0560025YB04	Externat 02 (hs)
			0560025YB10	Internat-g n°2 (post bac)
LORIENT	Lycée Colbert	3	0560026ZB04	D. Externat sciences
LORIENT	LP Marie Le Franc	5	0560027AB03	C. Externat & cdi
			0560027AB02	D. Préfabriqués (3)
			0560027AB10	G. Externat
PONTIVY	LEGTA	8	0560013KB14	Ateliers
			0560013KB30	Vestiaire
PORT LOUIS	LP Julien Crozet	8	0560042SB01	A. Administration
QUESTEMBERT	Lycée Marcelin Berthelot	1	0561641EB04	Fb. Atelier
ST JEAN BREVELAY	LP agricole	2	0560274UB20	Ateliers (paysagers)
VANNES	Lycée Alain-René Lesage	1	0560051BB02	E. Exter & cdi & logt (4)
			0560051BB06	G. Intendance
			0560051BB03	K. Exte.atelier op.infir &
			0560051BB13	Cpge
VANNES	LP Jean Guéhenno	8	0560053DB03	B. Externat (techno)
			0560053DB02	D. Cuisine
			0560053DB09	H. Internat-g logt (1)
			0560053DB01	A. Ateliers
VANNES	Lycée Charles de Gaulle	8	0561627PB01	C. Restauration

Annexe 4 : Planning des opérations de mise en accessibilité d'ici 2025

Dép.	Ville	Etablissement	Coût total Mise en accessibilité € TTC	Année travaux
22	DINAN	Lycée Polyvalent La Fontaine des Eaux	718 565	2020/2021/2023/2025
22	LANNION	Lycée GT Félix le Dantec	2 063 669	2020/2021/2022
22	TREGUIER	Lycée GT Joseph Savina	774 619	2022
29	BREST	Lycée GT Harteloire	588 568	2020
29	BREST	Lycée Iroise	337 801	2020
29	LANDIVISIAU	Lycée GT du Léon	209 715	2020
29	QUIMPERLE	Lycée Professionnel Roz Glas	190 523	2020
22	PAIMPOL	Lycée Polyvalent Kerraoul	358 555	2021
22	ST QUAY PORTRIEUX	Lycée Professionnel La Closerie	1 868 786	2023
29	CHATEAULIN	Lycée agricole et horticole de l'Aulne	196 074	2021
29	LANDERNEAU	Lycée Polyvalent de l'Elorn	1 936 110	2021
29	QUIMPER	Lycée GT Cornouaille	924 806	2021
29	QUIMPER	Lycée Technologique Chaptal	617 855	2021
29	QUIMPER	Lycée Polyvalent Yves Thépot	162 585	2021
29	TREFFIAGAT	Lycée Professionnel Maritime	103 394	2021
35	CESSON SEVIGNE	Lycée GT Sévigné	207 923	2021
35	TINTENIAC	Lycée Professionnel Bel Air	414 171	2021
56	LORIENT	Lycée Professionnel Marie Le Franc	97 433	2022
22	PAIMPOL	Lycée Maritime "Pierre Loti"	74 766	2022
22	ROSTRENEN	Lycée Professionnel Rosa Parks	1 237 420	2022
22	ST BRIEUC	Lycée Ernest Renan	2 011 314	2022
22	ST BRIEUC	Lycée GT François Rabelais	277 503	2022
29	BREST	Lycée Polyvalent Vauban site "Lanroze"	974 641	2022
29	BREST	Lycée Professionnel Jules Lesven	751 520	2022
29	BREST	Lycée Général La Pérouse – Kerichen	1 458 927	2022
29	BREST	Lycée Polyvalent Vauban	2 466 360	2022
35	COMBOURG	Lycée GT FR de Chateaubriand	112 282	2022
35	RENNES	Lycée Emile Zola	617 323	2022
35	RENNES	Lycée Jean Macé	682 284	2022
35	RENNES	Lycée GT René Descartes	656 660	2022
35	SAINT MALO	Lycée Polyvalent Jacques Cartier	1 089 625	2022
35	SAINT MALO	Lycée GT Maupertuis	673 550	2022
35	VITRE	Lycée Professionnel La Champagne	562 419	2022
35	VITRE	Lycée GT Bertrand d'Argentré	659 952	2022
56	GUER	Lycée Polyvalent Brocéliande	1 407 521	2022
56	HENNEBONT	Lycée Emile Zola	84 309	2022
56	JOSSELIN	Lycée Professionnel Ampère	335 936	2022
56	LOCMINE	Lycée Professionnel Louis Armand	269 492	2022
56	VANNES	Lycée GT Charles de Gaulle	228 298	2022
22	GUINGAMP	Lycée Professionnel Jules Verne	861 169	2023
22	QUINTIN	Lycée Professionnel Jean Monnet	275 152	2023
22	ST BRIEUC	Lycée Professionnel Jean Moulin	389 036	2023
29	BREST	Lycée Amiral Ronarc'h	1 127 975	2023
29	CHATEAULIN	Lycée GT Jean Moulin	658 831	2023
29	MORLAIX	Lycée Tristan Corbière	1 489 181	2023
29	PLEYBEN	Lycée Métiers du Bâtiment	457 723	2023
29	PONT DE BUIS	Lycée Professionnel	744 962	2023
29	QUIMPER	EREA Louise Michel	301 464	2023
35	DINARD	Lycée Polyvalent hôtelier Bourges	1 164 599	2023
35	FOUGERES	Lycée Professionnel Jean Guéhenno	986 917	2023
35	FOUGERES	Lycée Jean Guéhenno	296 900	2023
35	LE RHEU	Lycée Théodore Monod	1 507 643	2023
35	RENNES	Lycée Professionnel Jean Jaurès	586 489	2023
35	RENNES	Lycée GT Bréquigny	713 503	2023
56	AURAY	Lycée GT Benjamin Franklin	340 862	2023
56	HENNEBONT	Lycée GT Victor Hugo	479 065	2023
56	LORIENT	Lycée GT Dupuy de Lôme	837 058	2023
22	ST BRIEUC	Lycée Polyvalent Chaptal	602 035	2024
22	ST BRIEUC	Lycée GT Eugène Freyssinet	478 661	2024
29	BREST	Lycée Polyvalent Dupuy de Lôme	1 737 830	2024
29	CONCARNEAU	Lycée Polyvalent Pierre Guéguin	884 188	2024
29	DOUARNENEZ	Lycée GT Jean-Marie Le Bris	639 914	2024
29	QUIMPER	Lycée Brizeux	1 167 671	2024
29	QUIMPERLE	Lycée GT Kerneuzec	375 380	2024
35	REDON	Lycée GT Beaumont	817 450	2024
35	RENNES	Lycée Professionnel Louis Guilloux	498 430	2024
35	RENNES	Lycée Joliot Curie	1 294 151	2024
56	LANESTER	Lycée Polyvalent Jean Macé	315 822	2024
56	PONTIVY	Lycée Agricole Le Gros Chêne	840 986	2024

Dép.	Ville	Etablissement	Coût total en accessibilité TTC	Année travaux
56	PONTIVY	Lycée GT Joseph Loth	362 061	2024
56	PORT LOUIS	Lycée Professionnel Julien Crozet	442 265	2024
56	ST JEAN BREVELAY	Lycée Professionnel Horticole	563 676	2024
56	VANNES	Lycée Professionnel Jean Guéhenno	735 944	2024
22	CAULNES	EPLEFPA	904 063	2025
22	GUINGAMP	Lycée GT Auguste Pavie	522 984	2025
22	LAMBALLE	Lycée Polyvalent Henri Avril	905 693	2025
22	LOUDEAC	LYCÉE FULGENCE BIENVENUE	1 289 115	2025
22	MERDRIGNAC	Lycée du Mené	556 421	2025
22	PLOUISY	Lycée Agricole de Kernilien	323 816	2025
29	CARHAIX PLOUGUER	Lycée Polyvalent Paul Sérusier	2 267 305	2025
29	FOUESNANT	Lycée de Bréhoulou	569 101	2025
29	HANVEC	LEGTA HANVEC	302 215	2025
29	MORLAIX	Lycée de Suscinio	998 163	2025
29	PONT L'ABBE	Lycée GT Laënnec	721 259	2025
35	BAIN DE BRETAGNE	Lycée GT Jean Brito	90 594	2025
35	BRUZ	Lycée GT Anita Conti	188 038	2025
35	COMBOURG	CPSA Combourg	251 060	2025
35	DOL DE BRETAGNE	Lycée Professionnel Alphonse Pelle	196 606	2025
35	MONTFORT SUR MEU	Lycée GT René Cassin	168 749	2025
35	REDON	E.R.E.A. Jean Bart	386 876	2025
35	RENNES	E.R.E.A. Magda Hollander-Lafon	110 506	2025
35	RENNES	LP Coëtlogon	849 826	2025
35	RENNES	Lycée Chateaubriand	855 162	2025
35	RENNES	LYCÉE PIERRE MENDES-FRANCE	525 741	2025
35	RENNES	Lycée Professionnel Charles Tillon	416 307	2025
35	RENNES	Lycée Victor et Hélène Basch	983 314	2025
35	ST AUBIN DU CORMIER	Lycée Professionnel Agricole	426 179	2025
35	SAINT MALO	Lycée Public Maritime Florence Arthaud	21 818	2025
56	AURAY	LP Bertrand Duguesclin	646 044	2025
56	ETEL	Lycée Professionnel Emile James	697 826	2025
56	ETEL	Lycée Professionnel Maritime d'ETEL	296 466	2025
56	HENNEBONT	CFA Le Talhouët	100 250	2025
56	LORIENT	Lycée Polyvalent Colbert	2 059 262	2025
56	PLOEMEUR	E.R.E.A. Les Pins	542 696	2025
56	PONTIVY	Lycée Professionnel du Blavet	639 425	2025
56	QUESTEMBERT	Lycée polyvalent Marcellin Berthelot	593 887	2025
56	VANNES	Lycée GT Alain René Lesage	800 410	2025
			74 585 424	
